



# COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Approvato con delibera di Giunta n. M/1 del 17/12/2012  
Il Sindaco Gerardo

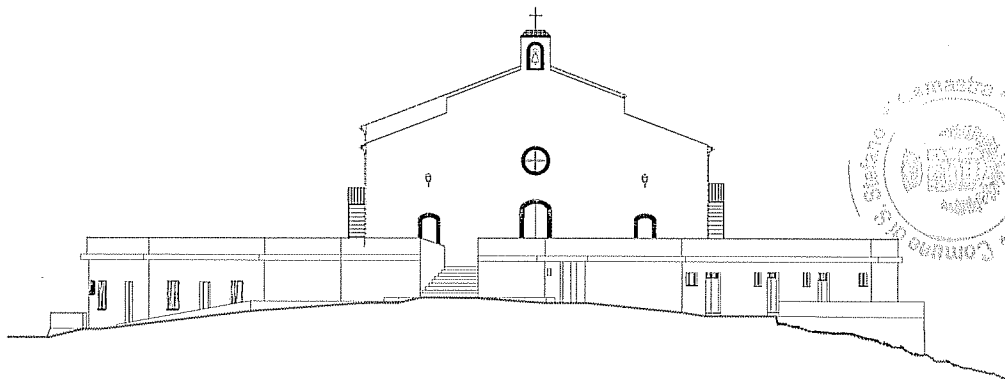


## Lavori di manutenzione straordinaria Chiesa Santuario Letto Santo

PROGETTO ESECUTIVO redatto ai sensi del D.Lgs.163 del 2006 e s.m.i., L.R. 12/2011 e s.m.i.

### Elaborati:

- A - Relazioni
- B - Rilievo Stato di fatto
- C - Progetto Architettonico
- D - Particolari costruttivi
- E - Elaborati amministrativi e contabili**

Il Progettista e D.L.  
Arch. Giacomo Mincica



### E.8 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

06 AGO. 2012

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA  
Ufficio Tecnico

Visto si esprime parere favorevole in linea tecnica per  
l'approvazione con le modifiche in rosso per l'importo  
complessivo di € 80.000,00

S. Stefano di Camastra, 27 NOV. 2012

(Arch. F. La Monica)



IL SINDACO

## Durata prevista delle lavorazioni

### cronoprogramma dei lavori

	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<u>mesi di lavoro</u>																				
<u>settimane</u>																				
<u>n° fasi di lavoro</u>																				
1	allestimento di cantiere e ponteggi	■																		
2	dismissione copertura	■	■																	
3	Posa in opera di pannelli isolanti		■	■																
4	Posa manto di copertura				■	■														
5	Opere di lattoneria				■	■														
6	Collocazione argilla espansa sulla volta					■														
7	Sostituzione Infissi esterni						■													
8	Pavimentazione corpo scala						■													
9	intonaco esterno e interno							■												
10	Opere di finitura e disallestimento cantiere								■											

### Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

<u>n° fasi di lavoro</u>	<u>impresa</u>	<u>giorni</u>	<u>n° addetti</u>	<u>u./giorni</u>	
1	allestimento di cantiere	1	2	3	6
2	dismissione copertura	1	6	3	18
3	Posa in opera pannelli isolanti	1	12	3	36
4	Posa manto di copertura	1	12	2	24
5	Opere di lattoneria	1	5	2	10
6	Collocazione argilla espansa sulla volta	1	3	2	6
7	Sostituzione Infissi esterni	1, 2	7	2	14
8	Pavimentazione corpo scala	2	2	2	4
9	intonaco esterno e interno	1	3	1	3
10	Opere di finitura e disallestimento cantiere	1	2	3	6
sommano				54	127

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->

127
